Harmonogram

ID	Task Name	Duration	Start	Finish	Predecessors
1	**Nušlova 2288 - 2293, Praha 5**	**67 dys**	**Mon 25.2.19**	**Mon 6.5.19**	
2	Předání staveniště	1 dy	Mon 25.2.19	Mon 25.2.19	
3	**Stavební práce**	**65 dys**	**Wed 27.2.19**	**Mon 6.5.19**	
4	**I. Etapa - 11. - 12. NP**	**32,2 dys**	**Wed 27.2.19**	**Tue 2.4.19**	
5	Montáž lešení	1 dy	Wed 27.2.19	Wed 27.2.19	2FS+1 dy
6	Očištění fasády	1 dy	Mon 4.3.19	Tue 5.3.19	5FS+4 dys
7	Demontáž oplechování parapetů	1 dy	Mon 4.3.19	Tue 5.3.19	6FF
8	Sanace podlah	7 dys	Thu 14.3.19	Fri 22.3.19	5FS+14 dys
9	Lepení a kotvení izolantu	10 dys	Wed 6.3.19	Sun 17.3.19	5FS+6 dys
10	Montáž armovací tkaniny, stěrkování	7 dys	Thu 14.3.19	Fri 22.3.19	9FF+5 dys
11	Oplechování	3 dys	Fri 22.3.19	Mon 25.3.19	10
12	Aplikace vnější silikonové omítky	4 dys	Tue 26.3.19	Sat 30.3.19	11FF+5 dys;10SS+10
13	Montáž zábradlí	2 dys	Sat 30.3.19	Mon 1.4.19	12
14	Montáž hromosvodu	0,1 dys	Mon 1.4.19	Mon 1.4.19	13
15	Demontáž lešení	0,1 dys	Mon 1.4.19	Tue 2.4.19	12;14
16	PŘÍLET RORÝSE OBECNÉHO	0,1 dys	Sat 20.4.19	Sat 20.4.19	
17	**II. Etapa - SV**	**65 dys**	**Wed 27.2.19**	**Mon 6.5.19**	
18	Montáž lešení	9 dys	Wed 27.2.19	Fri 8.3.19	2FS+1 dy
19	Očištění fasády	5 dys	Wed 6.3.19	Mon 11.3.19	18FF+3 dys
20	Demontáž oplechování parapetů	5 dys	Thu 7.3.19	Tue 12.3.19	19FF+1 dy
21	Lepení a kotvení izolantu	25 dys	Tue 12.3.19	Mon 8.4.19	20
22	Montáž armovací tkaniny, stěrkování	25 dys	Mon 18.3.19	Sat 13.4.19	21FF+5 dys
23	Oplechování	14 dys	Fri 5.4.19	Sat 20.4.19	22FF+7 dys
24	Aplikace vnější silikonové omítky	14 dys	Thu 11.4.19	Thu 25.4.19	23FF+5 dys
25	Montáž hromosvodu	5 dys	Fri 26.4.19	Wed 1.5.19	24
26	Demontáž lešení	5 dys	Wed 1.5.19	Mon 6.5.19	24;25

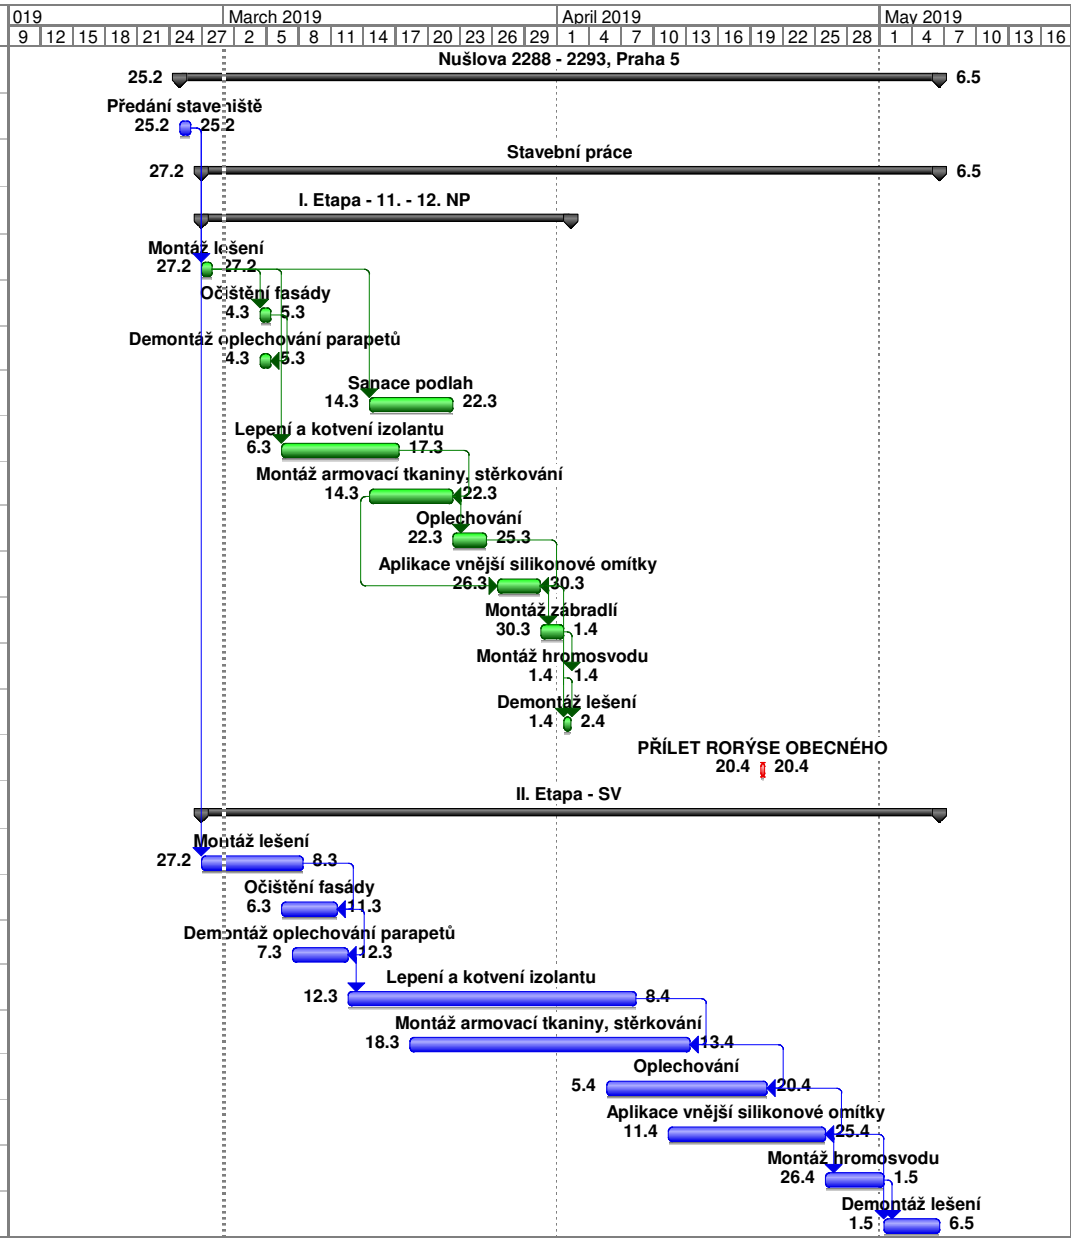

* zhotovitel si vyhrazuje právo operativně měnit tento hamonogram výstavby v závislosti na disponibilitě pracovních sil a dodávek materiálu; v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických podmínek bude postupováno dle platné SoD
